㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／2 ～ 2019／4

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	園部	丸山

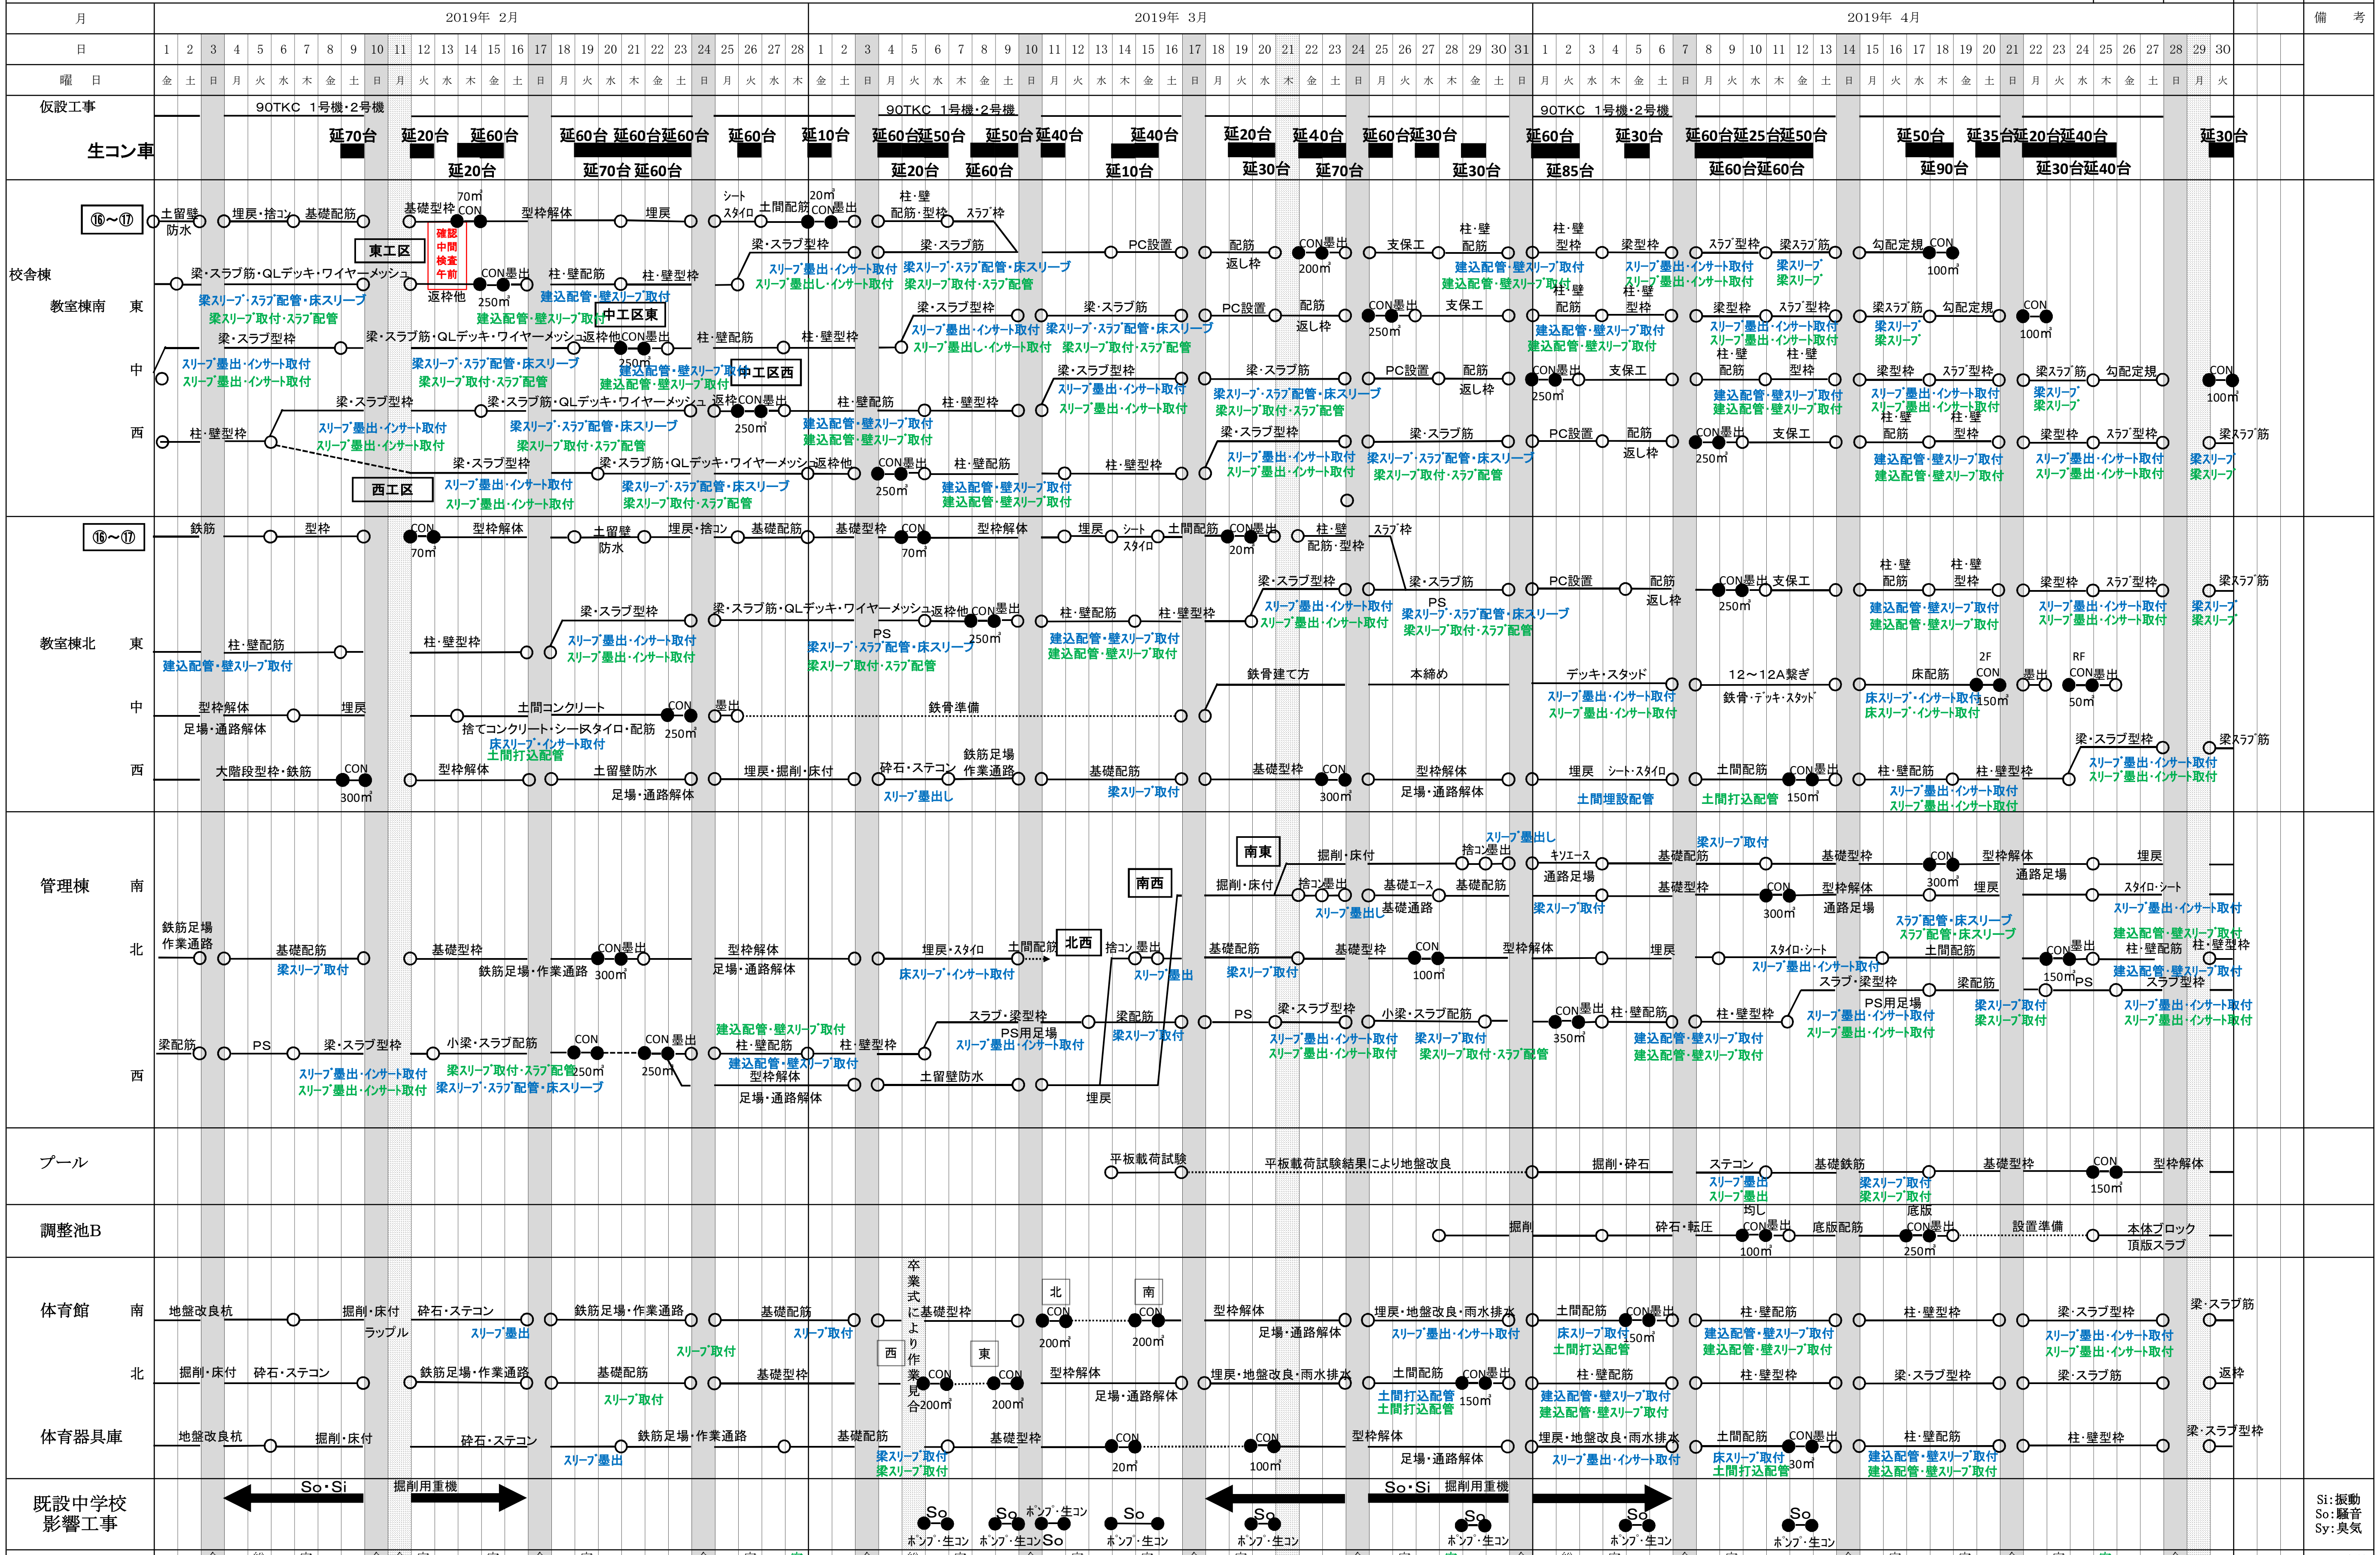

行事等

日	行事
2月3日	全休日
2月5日	総合定例打合
2月7日	安全パトロール
2月10日	全休日
2月11日	全休日
2月12日	定例打合
2月15日	安全協議会
2月17日	全休日
2月19日	定例打合
2月24日	全休日
2月26日	定例打合
2月28日	安全協議会
3月3日	全休日
3月5日	総合定例打合
3月7日	安全パトロール
3月10日	全休日
3月12日	定例打合
3月15日	安全協議会
3月17日	全休日
3月19日	定例打合
3月24日	全休日
3月26日	定例打合
3月28日	安全協議会
3月31日	全休日
4月2日	総合定例打合
4月4日	安全パトロール
4月7日	全休日
4月9日	定例打合
4月14日	全休日
4月16日	定例打合
4月19日	安全協議会
4月21日	全休日
4月23日	定例打合
4月26日	安全協議会
4月28日	全休日

祖東中学校
卒業式 3/5

2019年1月度
月間予定出来高 2.88%
累計予定出来高 11.93%
月間実施出来高 2.88%
累計実施出来高 11.93%

0.43% 5.90%
0.85% 13.30%
0.43% 5.90%
0.85% 13.30%

月			
2月	0.43	2.9	4.42 %
	3.19	17.9	16.35 %
3月	0.42	6.1	5.35 %
	3.61	24.0	21.88 %
4月	0.42	9.8	6.81 %
	4.03	33.8	28.69 %
