㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／5 ～ 2019／7

建築(黒)・機械設備(青)・電気(緑)

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

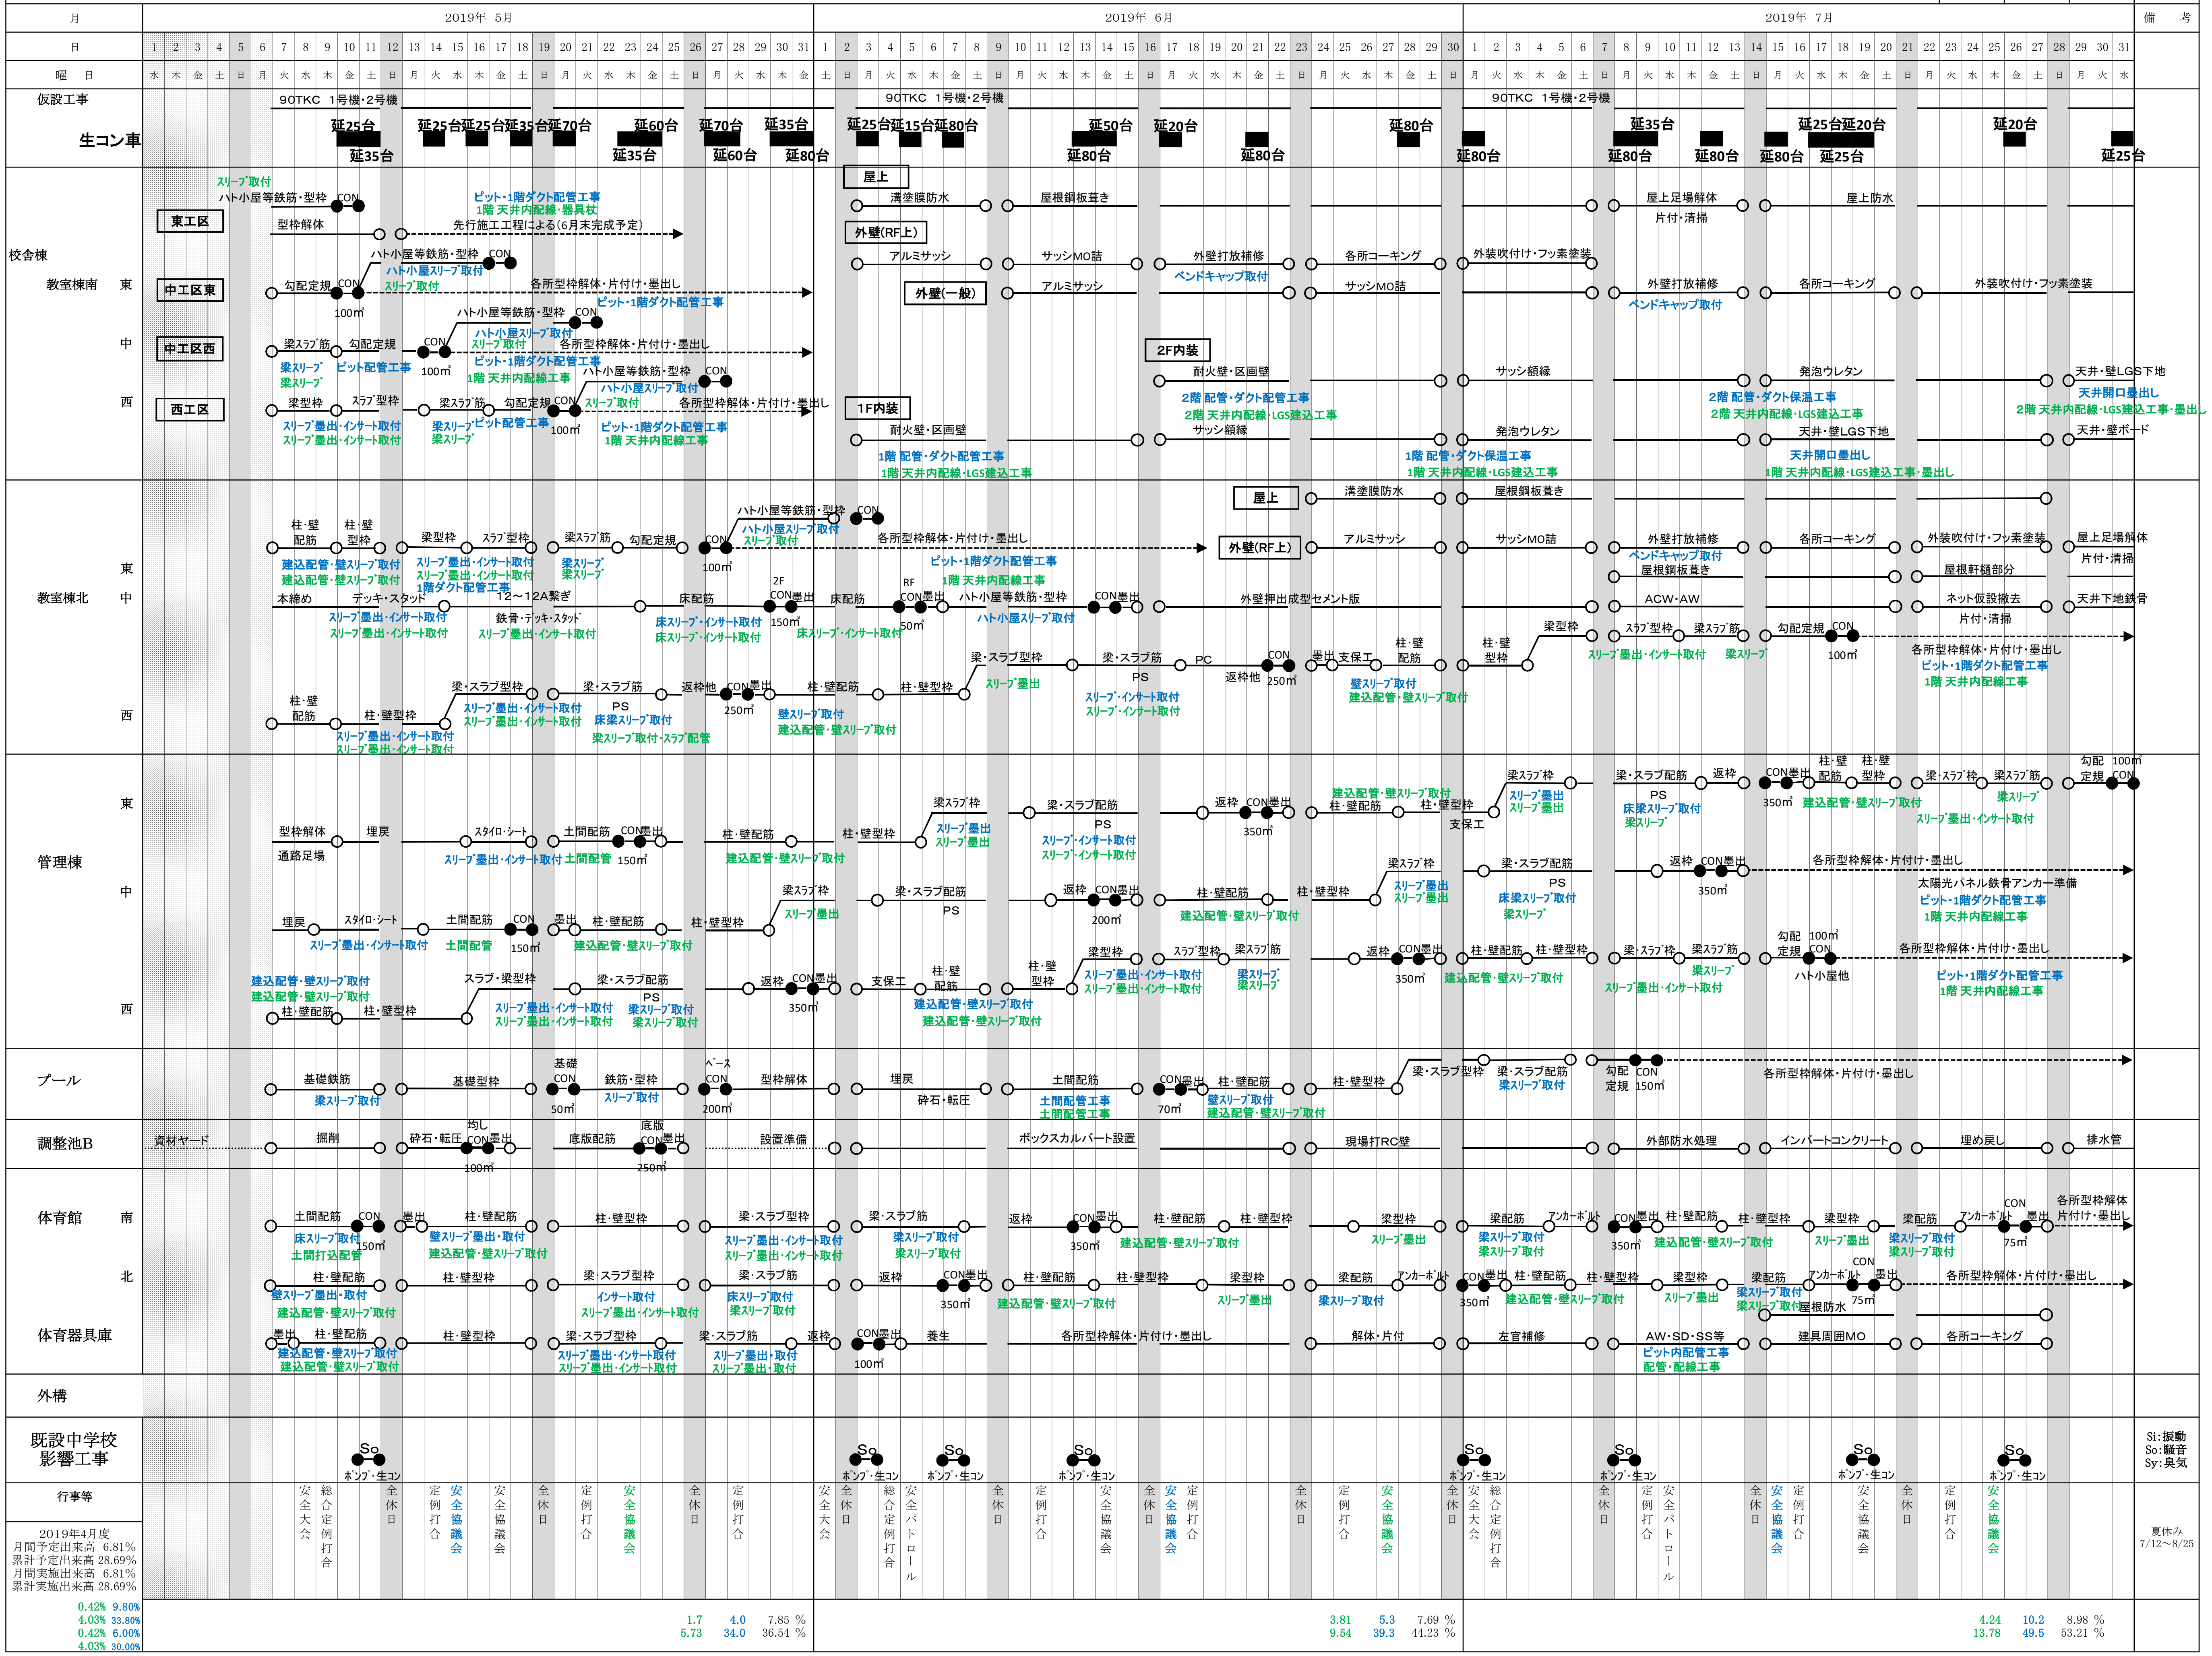

月
2019年 5月
2019年 6月
2019年 7月
備考
日
曜日
仮設工事
90TKC 1号機・2号機
生コン車
延25台 延35台 延25台 延25台 延35台 延70台 延60台 延35台 延70台 延60台 延35台 延80台
延25台 延15台 延80台 延50台 延80台 延20台 延80台 延80台
延80台 延35台 延80台 延80台 延80台 延25台 延20台 延25台 延20台 延25台
校舎棟
教室棟南 東 中 西
東工区
中工区東
中工区西
西工区
スリーブ取付
ハト小屋等鉄筋・型枠
CON
型枠解体
先行施工工程による(6月末完成予定)
ピット・1階ダクト配管工事
1階 天井内配線・器具付
勾配定規
100㎥
ハト小屋スリーブ取付
各所型枠解体・片付け・墨出し
梁スラブ筋
梁スリーブ
ピット配管工事
1階 天井内配線工事
梁型枠
スラブ型枠
スリーブ墨出・インサート取付
屋上
清塗膜防水
屋根鋼板葺き
外壁(RF上)
アルミサッシ
サッシMO詰
外壁打放補修
ペンドキャップ取付
各所コーキング
外装吹付け・フッ素塗装
外壁(一般)
屋上足場解体
片付・清掃
屋上防水
2F内装
耐火壁・区画壁
サッシ額縁
発泡ウレタン
2階 配管・ダクト保温工事
2階 天井内配線・LGS建込工事
1F内装
1階 配管・ダクト保温工事
1階 天井内配線・LGS建込工事
天井・壁LGS下地
天井開口墨出し
2階 天井内配線・LGS建込工事・墨出し
天井・壁ボード
教室棟北 東 中 西
柱・壁配筋
柱・壁型枠
建込配管・壁スリーブ取付
1階ダクト配管工事
本締め
デッキ・スタッド
12～12A梁ぎ
鉄骨・デッキ・スタッド
床配筋
床スリーブ・インサート取付
2F CON墨出
RF CON墨出
150㎥
50㎥
外壁押出成型セメント版
屋根軒樋部分
ACW・AW
ネット仮設撤去
天井下地鉄骨
梁・スラブ型枠
梁・スラブ筋
PS
PC
返枠他
250㎥
支保工
床梁スリーブ取付
梁スリーブ取付・スラブ配管
管理棟 東 中 西
型枠解体
通路足場
埋戻
スタイロ・シート
土間配筋
土間配管
柱・壁型枠
350㎥
200㎥
太陽光パネル鉄骨アンカー準備
ハト小屋他
プール
基礎鉄筋
基礎型枠
基礎 CON
鉄筋・型枠
ベース CON
型枠解体
埋戻
砕石・転圧
土間配筋
土間配管工事
70㎥
勾配定規
調整池B
資材ヤード
掘削
砕石・転圧
均し CON墨出
底版配筋
底版 CON墨出
設置準備
ボックスカルバート設置
現場打RC壁
外部防水処理
インバートコンクリート
埋め戻し
排水管
体育館 南 北
体育器具庫
土間打込配管
アンカーボルト
屋根防水
建具周囲MO
養生
解体・片付
左官補修
AW・SD・SS等
ピット内配管工事
配管・配線工事
外構
既設中学校影響工事
So
ポンプ・生コン
Si:振動
So:騒音
Sy:臭気
行事等
安全大会
総合定例打合
全休日
定例打合
安全協議会
安全パトロール
夏休み 7/12～8/25

2019年4月度
月間予定出来高 6.81%
累計予定出来高 28.69%
月間実施出来高 6.81%
累計実施出来高 28.69%

0.42%	9.80%
4.03%	33.80%
0.42%	6.00%
4.03%	30.00%

2019年5月		
1.7	4.0	7.85 %
5.73	34.0	36.54 %

2019年6月		
3.81	5.3	7.69 %
9.54	39.3	44.23 %

2019年7月		
4.24	10.2	8.98 %
13.78	49.5	53.21 %
