㈱鴻池組名古屋支店

(仮称)瀬戸市立小中一貫校建設(建築)工事　3ヵ月工程表

2019／7 ～ 2019／9

建築(黒)・**機械設備(青)**・**電気(緑)**

作成	建築	機械JV	電気JV
担当者	細川	板垣	丸山

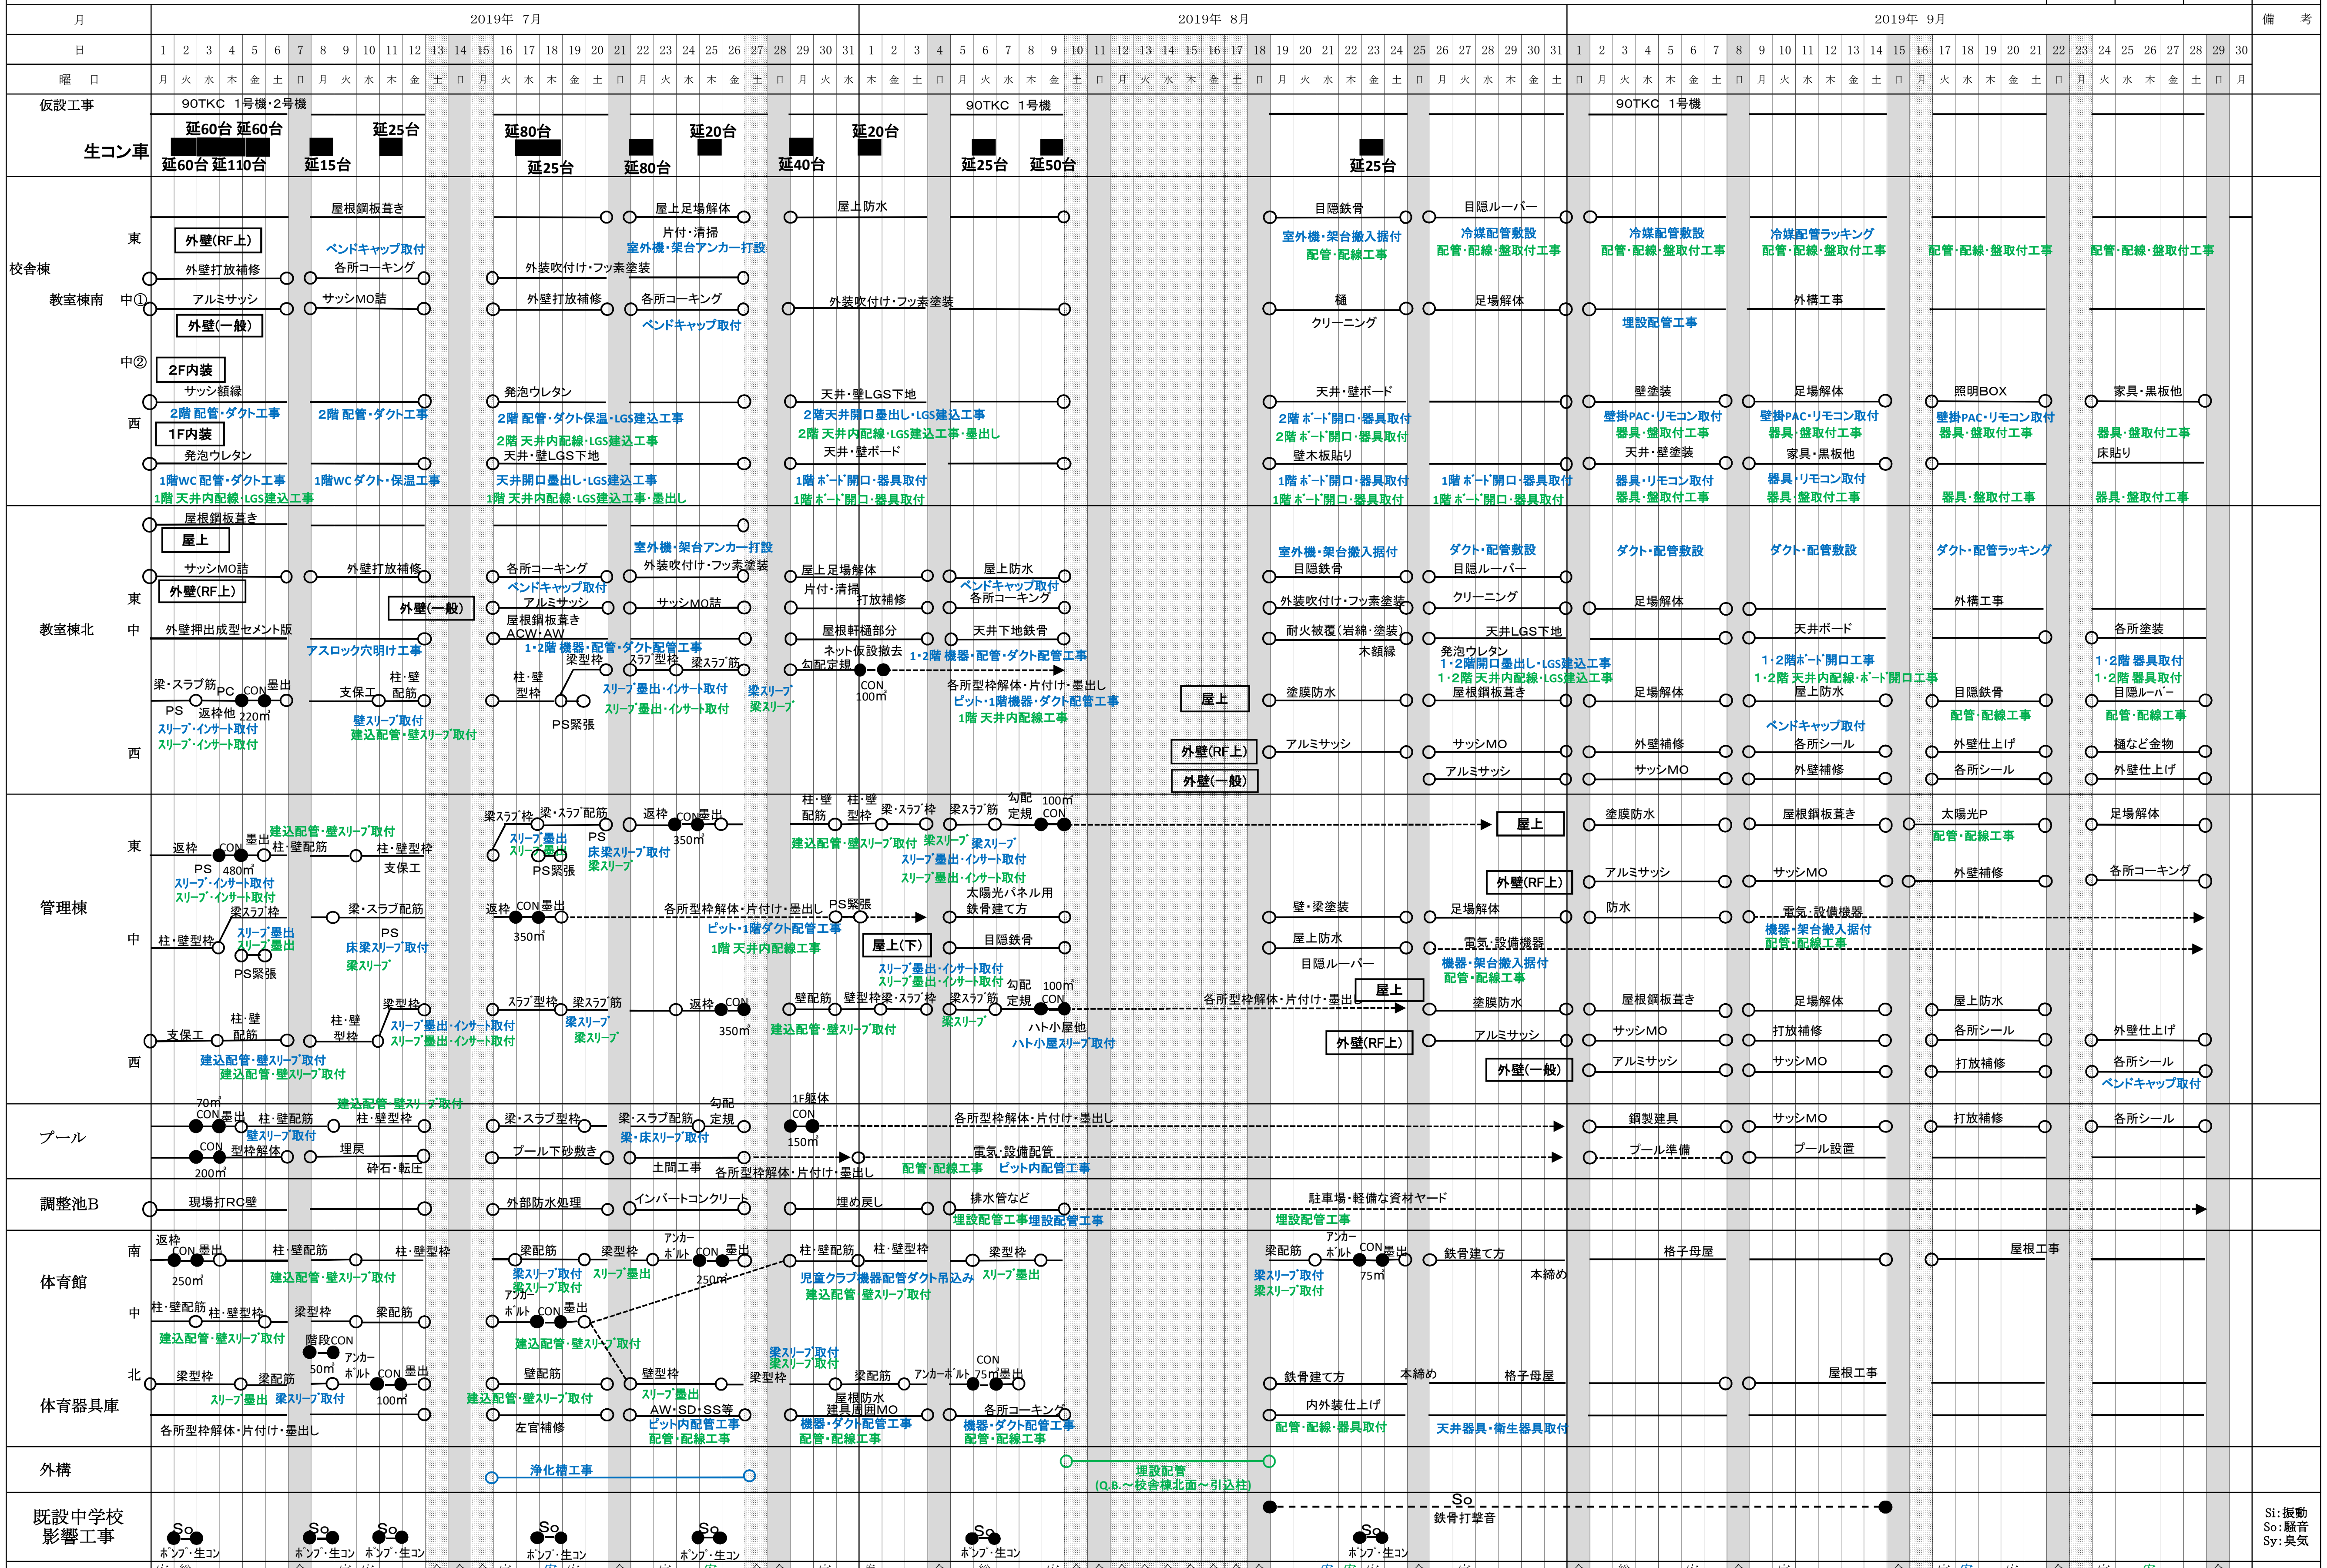

行事等：安全大会　総合定例打合　全休日　定例打合　安全パトロール　全休日　全休日　全休日　定例打合　安全協議会　安全協議会　全休日　定例打合　安全協議会　全休日　全休日　定例打合　安全大会・建災防パト　全休日　総合定例打合　安全パトロール　全休日　全休日　全休日　全休日　全休日　全休日　全休日　全休日　安全協議会　安全協議会　安全協議会　全休日　定例打合　全休日　総合定例打合　安全パトロール　全休日　定例打合　全休日　定例打合　安全協議会　安全協議会　全休日　定例打合　安全協議会　全休日

祖東中学校
夏休み
7/12～8/25

2019年6月度
月間予定出来高　7.69%
累計予定出来高 44.23%
月間実施出来高　7.69%
累計実施出来高 44.23%

3.81%　7.10%
9.54%　49.30%
3.81%　5.30%
9.54%　39.30%

月	電気	機械設備	建築
2019年 7月	4.24 13.78	10.2 49.5	8.98 % 53.21 %
2019年 8月	8.48 22.26	11.0 60.5	9.62 % 62.83 %
2019年 9月	8.47 30.73	11.5 72.0	9.98 % 72.81 %
