㈱鴻池組名古屋支店

作成
細川

（仮称）瀬戸市立小中一貫校建設（建築）工事　3ヵ月工程表

2020／7 ～ 2020／9

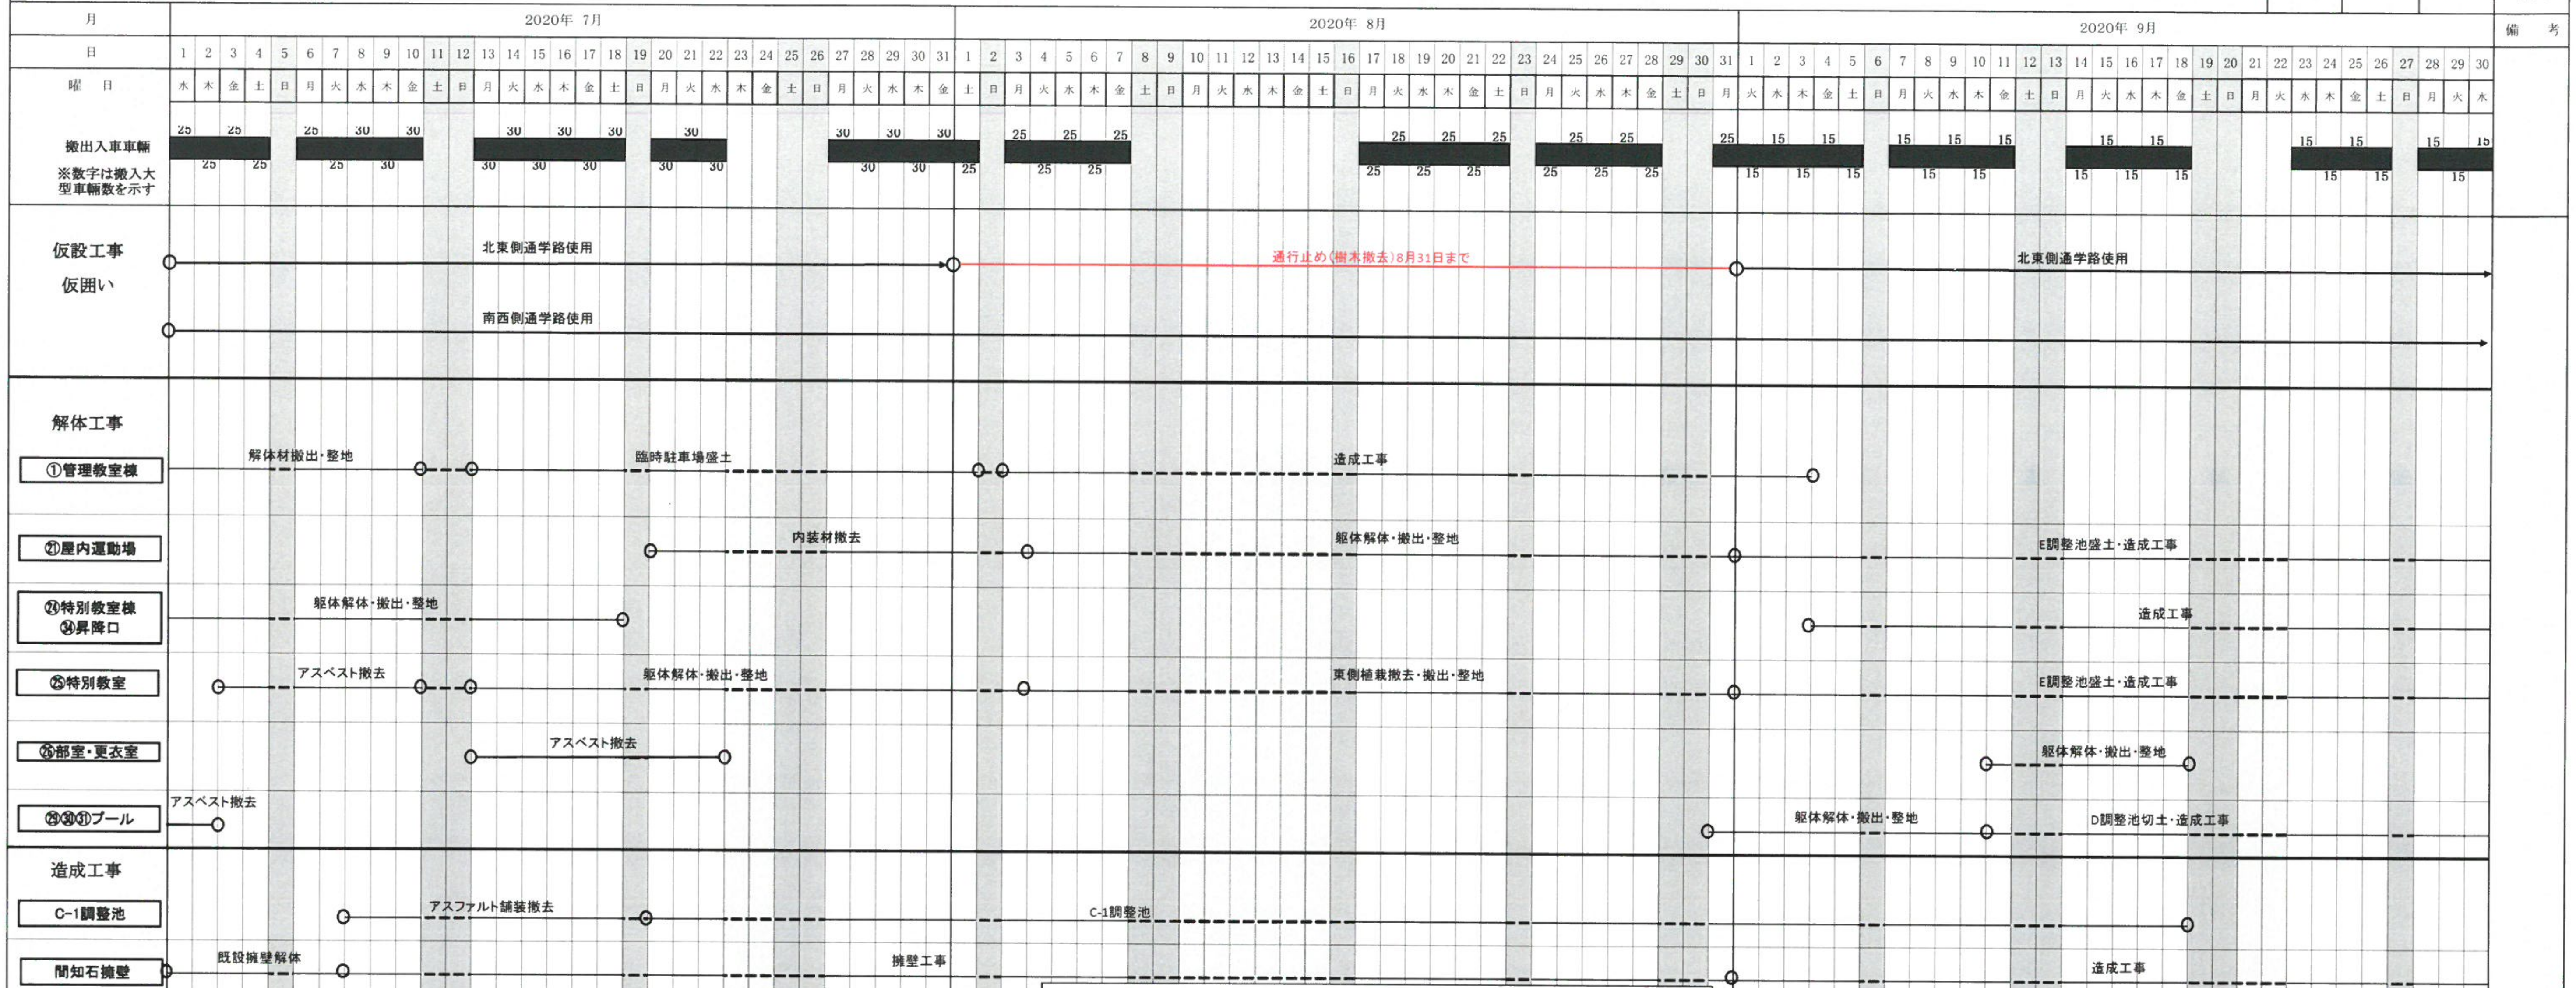

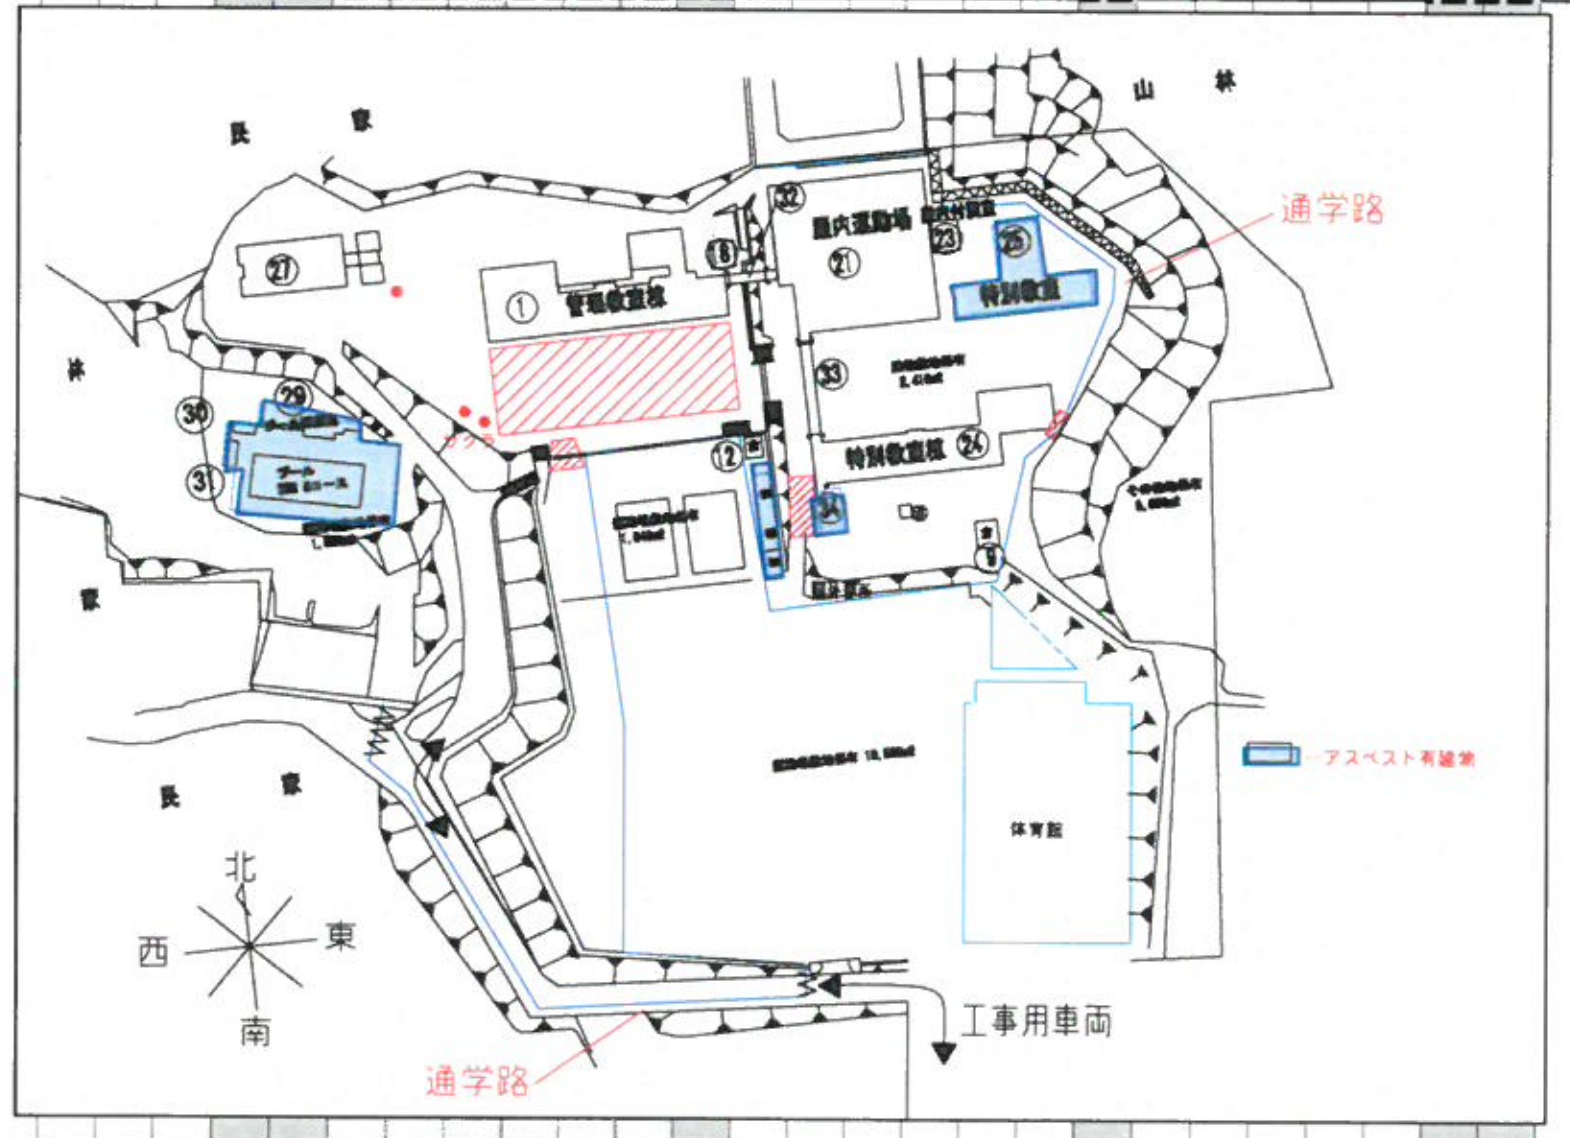
民家
山林
通学路
㉗
①
管理教室棟
⑱
㉜
屋内運動場
㉑
㉓
㉕
特別教室
㉝
⑫
特別教室棟
㉔
㉞
⑨
㉙
㉚
㉛
プール
林
家
民家
アスベスト有建物
体育館
北
西
東
南
工事用車両
通学路

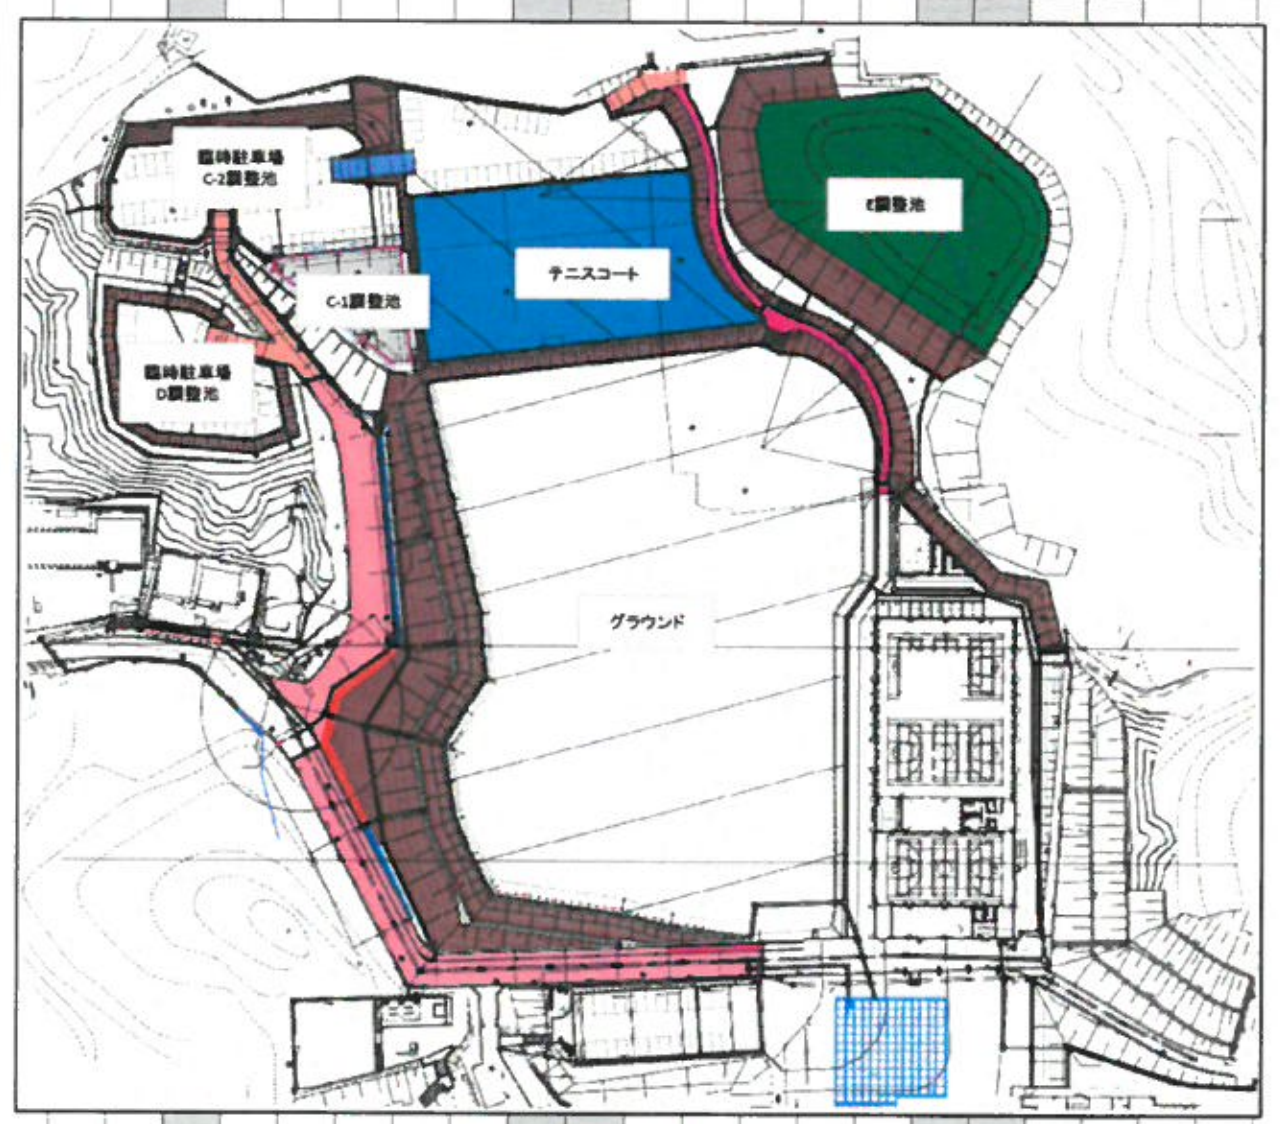
臨時駐車場 C-2調整池
C-1調整池
臨時駐車場 D調整池
テニスコート
E調整池
グラウンド

行事等	2020年 7月	2020年 8月	2020年 9月
	5 全休日 11 全休日 12 全休日 19 全休日 23 全休日 24 全休日 25 全休日 26 全休日	2 全休日 8 全休日 9 全休日 10 全休日 11 全休日 12 全休日 13 全休日 14 全休日 15 全休日 16 全休日 23 全休日 29 全休日 30 全休日	6 全休日 12 全休日 13 全休日 19 全休日 20 全休日 21 全休日 22 全休日 27 全休日
7月度 月間予定出来高　0.96% 累計予定出来高 93.71% 月間実施出来高　0.96% 累計実施出来高 93.71%	0.83 % 93.71 %	0.96 % 94.67 %	0.58 % 95.25 %
